

SITUACIÓN DE LAS OBRAS 2011 - 2012

**Convenios de Cooperación
ANDE - ITAIPU**

N° 4500009768 / 2008


N° 4500010424 / 2009

OBRAS ANDE

2010/2011/2012

OBRAS DE MEJORAMIENTO

DE LINEAS DE AUTOAYUDA

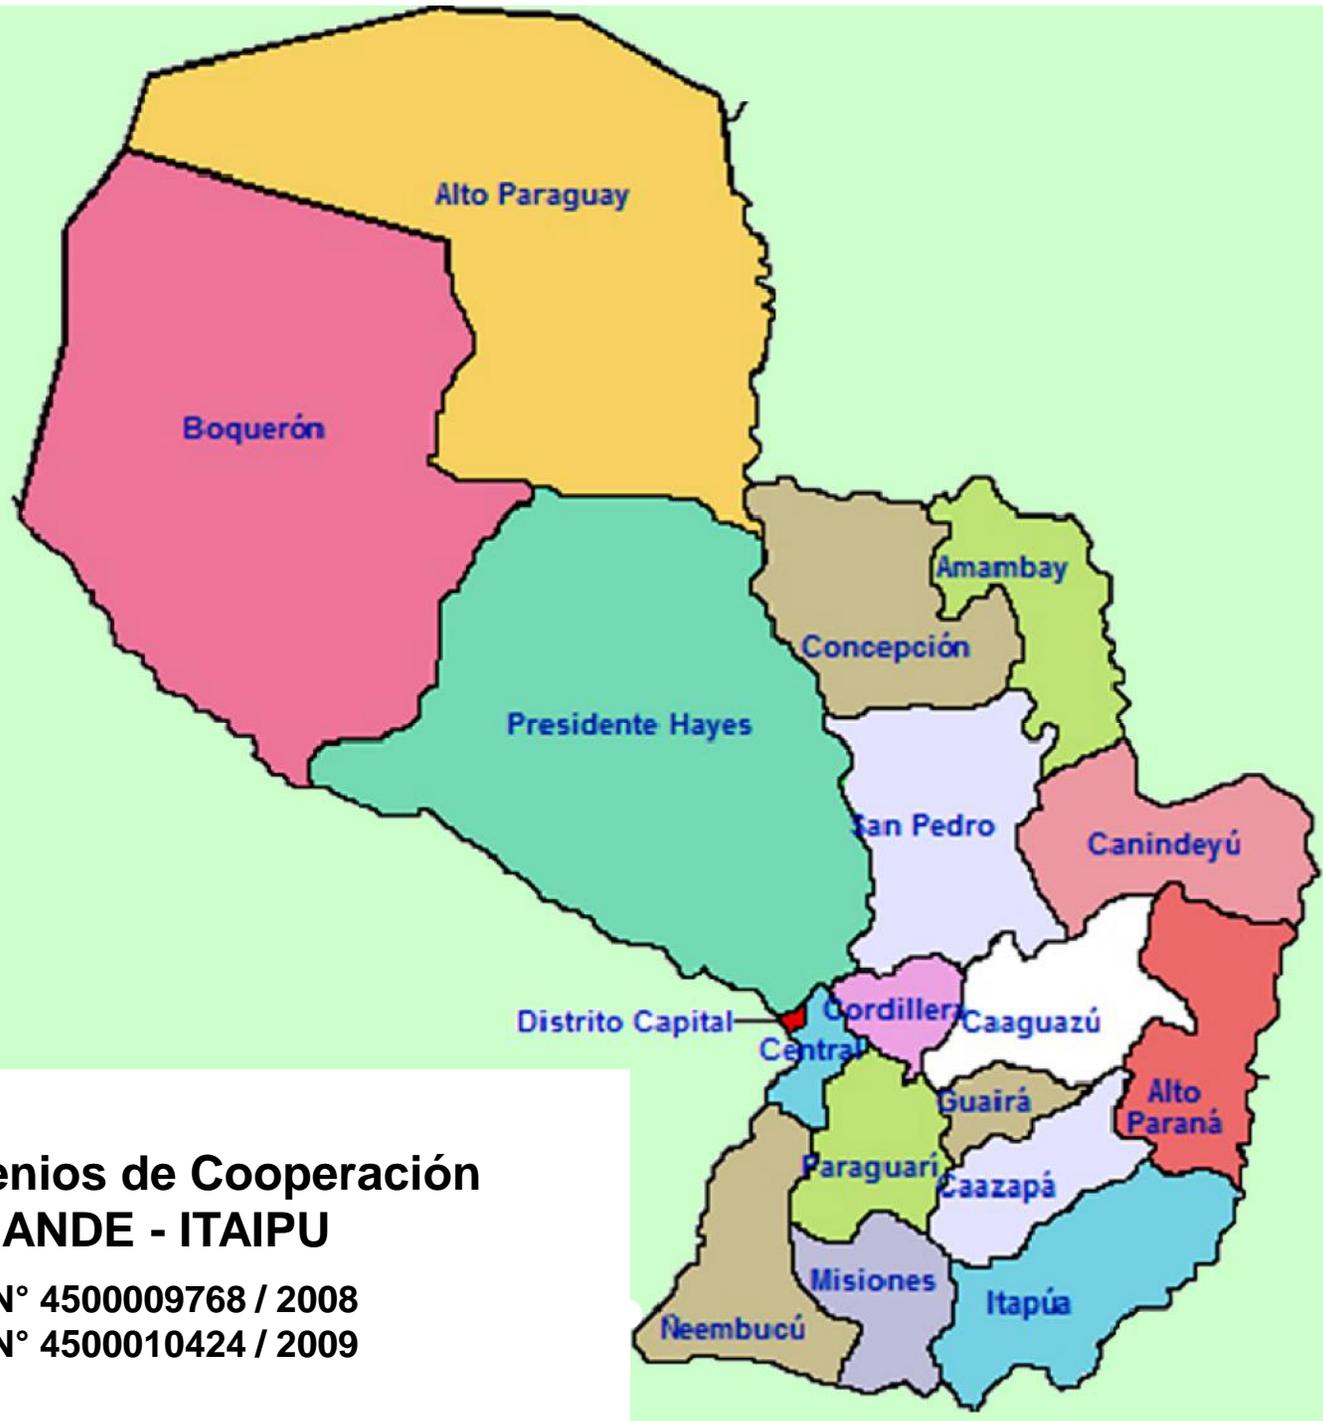

**Convenios de Cooperación
ANDE - ITAIPU**

N° 4500009768 / 2008
N° 4500010424 / 2009



Departamento de Alto Paraná

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
LCO 479/2010	3965/2010	CONSORCIO SINGEL S.A. - MAS INGENIERIA	499.820.826	30/04/2011	120	30/10/2012	62%	Obras de adecuación en red de media tensión desnuda a protegida en el centro de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná	En ejecución, los trabajos se realizan con cortes programados cedidos por la agencia de CDE.	Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 9.114 m Cable preensamblado BT de 3x70 + 1x50 mm ² = 2.854 m
LPN 560/2010	4022/2010	LOTE 1 Y 2: TECEL S.R.L.	963.800.050	05/05/2011	L1 10+80 L2 60+30	30/11/2012	70%	Obras de ampliación y adecuación en alimentadores APR 05 e Iluminación de avenidas	En ejecución	Cable subterráneo de 1x240 mm ² = 4.918 m. Cable de CU tipo NYY = 3.955 m.


	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Departamento de Guaira

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
LCO 470/2010	3964/10	SINGEL S.A.	195.726.375	29/04/2011	90	30/062012	55%	Obras de ampliación y adecuación en alimentador VIL 06, Dpto. de Guaira	Con pedido de Rescisión de contrato. Nota P ya fue remitida el 12/04/2012	

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Departamento de Ñeembucú

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
L.P.N. 445/2009	3821/10	SINGEL S.A.	1.701.915.743	22/06/2010	180	30/09/2012	92%	Nuevo Alimentador PIL 5 - Tramo Pilar - Alberdi	En ejecución	Cable subterráneo de 1x240 mm ² = 500 m. Cable de Aa de 150 mm ² = 153.225 m Cable de Aa de 70 mm ² = 176.940 m

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Resumen Gral. sobre la situación de las obras del Convenio ANDE-ITAIPU.

ANDE-ITAIPU 2010–2011-2012				Porcentajes			
CODIGO	ITAIPU	CONT. ANDE	TOTALES	ITA IPU (%)	CONT. ANDE (%)	TOTALES (%)	
6.1	0	4	4	0%	10,81%	3,74%	Obra en ejecución
6.1.P	0	0	0	0%	0%	0%	Obras iniciadas y paralizadas
6.2	0	0	0	0%	0%	0%	Obra sin estaqueo
6.3	0	0	0	0%	0%	0%	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
6.4	70	33	103	100%	89,19%	96,26%	Obra Concluida
	70	37	107	100%	100%	100%	

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



OBRAS ANDE
2010 / 2011 / 2012



Departamento de Alto Paraná

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Ejecución Previsto	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
LPN 641/2011	4367/2011	TECMONT	1.440.179.628	18/04/2012	120	30/10/2012	35%	Construcción de nuevo Alimentador K30-8.	En ejecución	Cable de Aa de 150 mm ² = 24.000 m
LPN 641/2011	4368/2011	TIESA	244.057.445	11/05/2012	60	30/09/2012	20%	Construcción de nuevo Alimentador FCO8 4-5 .	En ejecución	Cable de Aa de 150 mm ² = 6.000 m
LPN 641/2011	4368/2011	TIESA	881.172.313	11/05/2012	60	20/09/2012	70%	Mejoras y mantenimiento del Sistema de Distribución Este. Nuevo Alimentador de Minga Pora	En ejecución	Cable de Aa de 150 mm ² = 42.000 m
LPN 641/2011	4368/2011	TIESA	671.651.640	20/07/2012	90	15/12/2012	0%	Ampliación y adecuación de una zona del Alimentador HER 01. Desde el Poste 01 al 226.	En ejecución	Cable de Aa de 150 mm ² = 11.660 m Cable preensablado MT de 3x185 +1x70 mm ² = 1.680 m.
LPN 641/2011	4369/2011	EPESA	508.247.047	05/07/2012	90	30/10/2012	50%	Construcción de nuevo Alimentador FCO8 1-2 .	En ejecución	Cable de Aa de 150 mm ² = 6.000 m
LPN 641/2011	4369/2011	EPESA	1.510.690.549	04/07/2012	90	30/11/2012	5%	Ampliación y adecuación de una zona del Alimentador HER 01. Desde el Poste 226 al 390.	En ejecución	Cable de Aa de 150 mm ² = 18.624 m
LCO 493/2010	4005/2010	TECEL	236.985.750	18/01/2011	90	30/08/2012	99%	Construcción de línea de MT subterránea para Alimentador APR 9 y adecuación del alimentador ACY 5	En ejecución, falta solamente kit de empalme para cable subterráneo de 240	Cable subterráneo de 1x240 mm ² = 6.036 m.

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Departamento de Amambay

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
LPN 642/2011	4388/2011	CONSORCIO DE INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y DE CAMINOS - TECNOPLUS ING. S.A.	4.100.000.000	10/07/2012	180	06/01/2013	5%	Extensión de línea de MT alimentador CBV 01, tramo cruce Bella Vista - Puentesíño.	En ejecución	Cable de Aa de 70 mm ² = 186.000 m. Cable de Aa de 35 mm ² = 13.232 m.

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Departamento de Boquerón

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
LPN N° 704/2011	4585/2011	ROTEL INGENIERIA SRL.	667.318.440	30/04/2012	60	30/09/2012	90%	Construcción de Línea de MT Trifásica para el Tramo Cruce Infante Rivarola-Estancia Yvy Pora, Dpto. de Boquerón con provisión parcial de materiales.	En ejecución	Cable de Aa de 70 mm ² = 103.061 m Cable de Aa de 35 mm ² = 34.354 m
LPN N° 716/2011	4629/2011	PROEL INGENIERIA DEL ING. AUGUSTO ORTELLADO	2.471.507.686	24/07/2012	120	21/11/2012	40%	Electrificación de Comunidades Indígenas y de la Base Aérea del Distrito de Nueva Asunción, Dpto. de Boquerón"	En ejecución	Cable de Aa de 95 mm ² = 124.702 m.

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Departamento de Caaguazú

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
LPN 643/2011	4392/2011	CONSORCIO NUEVO HORIZONTAL E (Sociedad Constructora Chaco S.R.L. - Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A)	1.174.855.261	02/08/2012	90	31/10/2012	0%	Cambio de secc. De conductor desnudo de 70 a 150 mm ² del alimentador CYO 02, tramo cruce Sta. Catalina - cruce Simón Bolívar, distrito de Carayao, Dpto. de Caaguazú.	En Ejecución	Cable de Aa 150 mm ² = 34.017 m
LPN 643/2011	4392/2011	CONSORCIO NUEVO HORIZONTAL E (Sociedad Constructora Chaco S.R.L. - Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A)		20/08/2012	90	18/11/2012	0%	Cambio de secc. De conductor desnudo de 70 a 150 mm ² del alimentador CYO 03, tramo cruce Simón Bolívar, San Joaquín distrito de Simón Bolívar – San Joaquín, Dpto. de Caaguazú.	En Ejecución	Cable de Aa 150 mm ² = 60.000 m

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Departamento de Caazapa

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
LPN N° 643/2011	4392/2011	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE	Min. 5.793248.760 Max. 9.673.221.028	28/06/2012	90	30/09/2012	5%	Cambio de sección de conductor del Alimentador NAR 02, tramo km 24 San Cristóbal (Alto Paraná) - Paulista (Caazapá). Sistema de Distribución Centro. Localidad de Tupa Renda, (Avaí), Dpto. de Caazapá.	En ejecución	Cable de Aa de 150 mm ² = 42.000 m Cable de Aa de 70 mm ² = 13.500 m.

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Departamento de Central

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
L.P.N 590/2010	4203/2011	Consortio eléctrico: Cotepa – Caldetec .	1.140.823.382	10/08/2011	90	30/08/2012	80%	Construcción de Nuevo Alimentador LIM 08	En ejecución	Cable subterráneo de 1x240 mm ² = 870 m. Cable de Aa de 150 mm ² = 18.492 m Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 5.667 m.
L.P.N 591//2010	4208/2011	ICI S.A.	852.593.534	16/09/2011	100	30/08/2012	85%	Construcción de nuevos alimentadores del Centro de Distribución San Antonio (SAN 06 y SAN 07)	En ejecución	Cable subterráneo de 1x240 mm ² = 2.150 m. Cable de Aa de 150 mm ² = 5.328 m Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 5.480 m.
L.P.N 634/2011	4330/2011	CONSORCIO INGELCO SRL - SAGUAN SA.	2.290.000.000	20/12/2011	120	30/09/2012	65%	Construcción de nuevos alimentadores de MT LUQ 07, 08, 09, 10 y 11 de la ciudad de Luque y adecuación de alimentadores existentes de las ciudades de San Lorenzo y Limpio, Dpto. Central.	En ejecución	Cable subterráneo de 1x240 mm ² = 8.407 m. Cable de Aa de 150 mm ² = 3.705 m Cable de Aa de hasta 95 mm ² = 22.804 m Cable preensamblado MT de 3x185 +1x70 mm ² = 17.312 m. Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 6.900 m.

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Departamento de Central

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
LPN Nº 708/2011	4625/2011	CONSORCIO METROPOLITANO - ASUNCION (PROMON SRL - YPOA INGENIERIA SA - MAS INGENIERIA)	1.077.520.069	31/07/2012	60	30/10/2012	5%	Mejoras y Mantenimiento del Sistema de Distribución Metropolitano. Acople BPA 04 - PBO 10 - PBO 03. Línea Protegida.	En ejecución	Cable subterráneo de 1x240 mm ² = 384 m. Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 2.246 m.
LPN Nº 708/2011	4625/2011	CONSORCIO METROPOLITANO - ASUNCION (PROMON SRL - YPOA INGENIERIA SA - MAS INGENIERIA)	2.065.338.946	16/04/2012	120	15/09/2012	90%	Mejoras y Mantenimiento del Sistema de Distribución Metropolitano. LAM 02 y LAM 10. Línea Protegida.	En ejecución	Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 3.760 m. Cable preensamblado de 3x70 + 1x50 mm ² = 1499 m.
LPN Nº 708/2011	4625/2011	CONSORCIO METROPOLITANO - ASUNCION (PROMON SRL - YPOA INGENIERIA SA - MAS INGENIERIA)	968.658.668	14/06/2012	120	30/10/2012	30%	Mejoras y Mantenimiento del Sistema de Distribución Metropolitano. LAM 09	En ejecución	Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 1.711 m.
LPN Nº 708/2011	4625/2011	CONSORCIO METROPOLITANO - ASUNCION (PROMON SRL - YPOA INGENIERIA SA - MAS INGENIERIA)	1.944.364.711	17/07/2012	90	30/10/2012	5%	Mejoras y Mantenimiento del Sistema de Distribución Metropolitano. Cambio de sección de conductor desnudo de 70 mm ² a protegido de 185 mm ² correspondiente al alimentador LAM 08.	En ejecución	Cable preensamblado de 3x70 + 1x50 mm ² = 3.406 m. Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 3.760 m.

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Departamento de Central

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
LPN N° 708/2011	4625/2011	CONSORCIO METROPOLITANO - ASUNCION (PROMON SRL - YPOA INGENIERIA SA - MAS INGENIERIA)		20/08/2012	90	18/11/2012	0%	Cambio de sección de Red de MT desnudo a Protegido de 185 mm ² correspondiente al alimentador PBO 08.	En Ejecución	Cable subterráneo de 1x240 mm ² = 303 m. Cable preensamblado de 3x70 + 1x50 mm ² = 1.571 m Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 1.439 m.
LPN N° 708/2011	4626/2011	CONSORCIO WES - BHM	1.780.906.338	23/07/2012	90	30/10/2012	0%	Construcción de línea y cambio de sección de 35 mm ² a protegido de 185 mm ² , alimentador SLO 06 - SLO14.	En Ejecución	Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 4.144 m.
LPN N° 708/2011	4627/2011	CONSORCIO ELECTRICO METROPOLITANO (INGELCO SRL - SAGUANA SA - TECELSA)						Nuevo Alimentador CAP 08.	La obra ya fue estaqueada, se espera el informe del fiscal par el 20/08/2013	Cable subterráneo de 1x240 mm ² = 1.371 m. Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 4.696 m.
LPN N° 708/2011	4627/2011	CONSORCIO ELECTRICO METROPOLITANO (INGELCO SRL - SAGUANA SA - TECELSA)						Acople entre los Alimentadores LAV 05 y CAP 07.	La obra ya fue estaqueada, se espera el informe del fiscal par el 20/08/2013	Cable de Aa de 150 mm ² = 5.367 m Cable preensamblado de 3x35 + 1x50 mm ² = 1.001 m.

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Departamento de Central

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
LPN N° 708/2011	4626/2011	CONSORCIO WES - BHM		31/07/2012	90	29/10/2012	0%	Acople entre los alimentadores de SLO 06 -SLO14.	En Ejecución	Cable subterráneo de 1x240 mm ² = 800 m.
LPN N° 708/2011	4626/2011	CONSORCIO WES - BHM	428.847.108	0/08/2012	90	06/11/2012	0%	Construcción de Nuevo Alimentador REP 07	En Ejecución	Cable subterráneo de 1x240 mm ² = 1.047 m. Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 908 m. Cable preensamblado BT de 3x70 +1x50 mm ² = 566 m.
LPN N° 708/2011	4627/2011	CONSORCIO ELECTRICO METROPOLITANO (INGELCO SRL - SAGUAN SA - TECEL SA)	776.332.524	10/07/2012	90	08/10/2012	5%	Adecuación de red MT Y BT del Alimentador VAU 3 línea Protegida	En Ejecución	Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 749 m.
LPN N° 708/2011	4627/2011	CONSORCIO ICI SA - CONO SRL - GCA SA.		08/08/2012	120	06/12/2012	0%	Adecuación de red MT Y BT del Alimentador SLO 2 y 3 línea Protegida	En Ejecución	Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 9.457 m.
LPN N° 708/2011	4627/2011	CONSORCIO ELECTRICO METROPOLITANO (INGELCO SRL - SAGUAN SA - TECEL SA)	356355450	02/08/2012	90	31/10/2012	0%	Acople entre los alimentadores ITG01 con ITG06, Compañía Potrero Guazú - Guazú Vira - Potrerito distrito de Itagua.	En Ejecución	Cable de Aa de 150 mm ² = 7.410 m

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Departamento de Central

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
LPN N° 708/2011	4627/2011	CONSORCIO ELECTRICO METROPOLITANO (INGELCO SRL - SAGUAN SA - TECEL SA)	27.048.641	02/08/2012	60	01/10/2012	0%	Cambio de secc. de conductor de 3x35 a 3x70 mm ² en el alimentador CAP 03, distrito de Capiatá.	En Ejecución	Cable de Aa de 70 mm ² = 768 m.
LPN N° 708/2011	4627/2011	CONSORCIO ELECTRICO METROPOLITANO (INGELCO SRL - SAGUAN SA - TECEL SA)	Min. 2.037.197.888 Max. 3.398.053.156					Cambio de secc. de conductor desnudo de 35 a 185 mm ² línea protegida en las calles Stma. Trinidad, Rio Montelindo y Tte. 1° Pessolani, zona de Asunción.	La obra ya fue estaqueada, se espera el informe del fiscal par el 22/08/2012	Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 772 m. Cable preensamblado de BT 3x70 + 1x50 mm ² = 464 m.
LPN N° 708/2011	4628/2011	CONSORCIO ICI SA - CONO SRL - GCA SA.	1.656.277.735	05/06/2012	120	03/10/2012	15%	Trabajos de Acople de los Alimentadores ESA 3 con ESA 5	En Ejecución	Cable de Aa de 150 mm ² = 2.493 m Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 2.063 m.
LPN N° 708/2011	4628/2011	CONSORCIO ICI SA - CONO SRL - GCA SA.		06/08/2012	60	05/10/2012	0%	Construcción de Nuevo Alimentador SMI 11	En Ejecución	Cable subterráneo de 1x240 mm ² = 700 m. Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 2.257 m.

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Departamento de Concepción

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
LPN 642/2011	4390/2011	BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES	2.008.370.695	28/06/2012	120	26/10/2012	10%	Construcción de nuevo Alimentador CON 04.	En ejecución	Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 4.643 m. Conjunto de 3 conductores protegidos de 70 mm ² = 1.283 m.
LPN 642/2011	4391/2011	TIESA	1.064.596.628	28/06/2012	120	26/10/2012	5%	Construcción de nuevo Alimentador CON 05.	En ejecución	Cable subterráneo de 1x240 mm ² = 504 m. Cable de Aa de 50 mm ² = 17.271 m

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Departamento de Itapúa

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
L.C.O. 532/2010	4028/10	TIE S.A.	291.146.184	15/03/2011	80	30/10/2012	50%	Ejecución de Obras de Adecuación de Alimentadores NAT 2 y SPA 2 en las localidades de Natalio 10 y Santa María, Dptos. de Itapúa y Misiones.	En ejecución,	Cable de Aa de 150 mm ² = 38.030 m Cable de Aa de 70 mm ² = 22.500 m.
LPN Nº 640/2011	4469/2011	CONSORCIO ING. OSVALDO BALMACEDA - GAUSS S.A.	5.324.277.093	23/04/2012	180	20/10/2012	55%	Ejecución de trabajos de mejoras y mantenimiento del Sistema de Distribución Sur, Con provisión de materiales, bajo la modalidad de contrato abierto. Construcción de los Alimentadores PPO 01 y PPO 04, distrito de Pirapo, Itapúa.	En ejecución,	Cable de Aa de 70 mm ² = 1.407 m Conjunto de 3 conductores protegidos de 185 mm ² = 23.360 m.
LPN Nº 640/2011	4470/2011	CONSORCIO DEL SUR (Elemec Ingeniería del Ing. Francisco Ortiz - Ing. Cesar Zarate - DC Ingeniería S.A.)	Min. 1.597.516.876 Max. 2.662.138.547	14/03/2012	180	30/09/2012	60%	Ejecución de trabajos de mejoras y mantenimiento del Sistema de Distribución Sur, Con provisión de materiales, bajo la modalidad de contrato abierto. Construcción del Alimentador PPO 03, distrito de Pirapo, Itapúa.	En ejecución,	Cable de Aa de 70 mm ² = 38.580 m

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Departamento de Itapúa

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
LPN N° 640/2011	4470/2011	CONSORCIO DEL SUR (Elemec Ingeniería del Ing. Francisco Ortiz - Ing. Cesar Zarate - DC Ingeniería S.A.)	306.891.102	08/08/2012	120	06/12/2012	0%	Construcción de líneas de MT Aérea y Subterránea correspondientes a los Alimentadores de PPO, distrito de Pirapo, Itapúa.	En Ejecución	Cable de Aa de 70 mm ² = 20.757 m
LPN N° 640/2011	4471/2011	CONSORCIO AYOLAS (Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado - Ingelmec S.R.L.)	1.250.549.536	10/04/2012	120	15/09/2012	95%	Ejecución de trabajos de mejoras y mantenimiento del Sistema de Distribución Sur, Con provisión de materiales, bajo la modalidad de contrato abierto. Construcción del Alimentador PPO 02, distrito de Pirapo, Itapúa.	En Ejecución	Cable de Aa de 70 mm ² = 28.330 m Cable de Aa de 150 mm ² = 6.700 m
LPN N° 640/2011	4472/2011	CONSORCIO SUR (Cotepa S.R.L. - Caldetec Ingeniería S.R.L. - Cociel Ingeniería S.R.L.)	1.578.871.867	04/05/2012	120	30/09/2012	60%	Ejecución de trabajos de mejoras y mantenimiento del Sistema de Distribución Sur, Con provisión de materiales, bajo la modalidad de contrato abierto. Construcción de los Alimentadores PPO 03, distrito de Pirapo, Itapúa.	En Ejecución	Cable de Aa de 70 mm ² = 52.432m

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Departamento de Itapúa

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
LPN N° 640/2011	4472/2011	CONSORCIO SUR (Cotepa S.R.L. - Caldetec Ingeniería S.R.L. - Cociel Ingeniería S.R.L.)	514.848.243	21/05/2012	75	30/08/2012	100%	Ejecución de trabajos de mejoras y mantenimiento del Sistema de Distribución Sur, Con provisión de materiales, bajo la modalidad de contrato abierto. Construcción de los Alimentadores PPO 01, distrito de Pirapo, Itapúa.	Concluido	Cable de Aa de 70 mm ² = 26.440 m

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Departamento de San Pedro

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra	Tendido de líneas (m.)
LPN N° 643/2011	4392/2011	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE	1.393.868.708	02/08/2012	90	31/10/2012	0%	Construcción de Nuevo Alimentador SES 06, tramo CD San Estanislao - Ruta 03. Sistema de Distribución Centro. Localidad de San Estanislao, Dpto. de San Pedro.	En ejecución	Cable de Aa de 150 mm ² = 22.956 m
LPN N° 643/2011	4392/2011	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE (Sociedad Constructora Chaco S.R.L. - Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A)	344.693.239	04/07/2012	90	01/10/2012	40%	Construcción de Nuevo Alimentador SRO 04, tramo CD Sta. Rosa - Cruce Ruta 03. Sistema de Distribución Centro. Localidad de Santa Rosa del Aguaray, Dpto. de San Pedro.	En ejecución	Cable subterráneo de 1x240 mm ² = 165 m. Cable de Aa de 150 mm ² = 4.188 m
LPN N° 643/2011	4392/2011	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE	1.462.562.569	02/08/2012	90	31/10/2012	0%	Cambio de secc. De conductor desnudo de 70 a 150 mm ² del alimentador SRO 02, tramo cruce Lima - Col. Yvype, distrito de Lima, Dpto. de San Pedro.	En Ejecución	Cable de Aa de 150 mm ² = 42.333 m
LPN N° 643/2011	4392/2011	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE	84.413.557	07/06/2012	60	30/09/2012	5%	Acople de los alimentadores SRO 01 con SRO 03, distrito de Sta. Rosa del Aguaray, Dpto. de San Pedro.	En Ejecución	
LPN N° 643/2011	4392/2011	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE		20/08/2012	90	18/11/2012	0%	Nuevo Alimentador SRO 05 - CD Sta. Rosa, tramo CD Sta. Rosa cruce Camba Ycua. Localidad Sta Rosa del Aguaray, Dpto. de San Pedro.	En Ejecución	

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato



Resumen Gral. sobre la situación de las obras financiadas por ANDE.

Obras ANDE 2010–2011-2012		Porcentajes	
CODIGO	ANDE	ANDE (%)	
6.1	50	63,29%	Obra en ejecución
6.1.P	0	0,00%	Obras iniciadas y paralizadas
6.2	0	0,00%	Obra sin estaqueo
6.3	4	5,06%	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
6.4	25	31,65%	Obra Concluida
	79	100%	

	Obra en ejecución
	Obra sin estaqueo
	Obra con estaqueo, en proceso de entrega de materiales o pendiente de inicio por su falta
	Obra Concluida
	Obra en proceso de firma de contrato






**OBRAS DE MEJORAMIENTO
DE LINEAS DE AUTOAYUDA**




Departamento de Alto Paraná

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra
L.P.N. 661/11 SP 1	4316/11	ROTEL Ingeniería S.R.L.	933.278.659	05/032012	150	02/08/2012	98%	Obra de Normalización de Líneas de Autoayuda en las loc. De Acaray Costa, Cristo Rey, Cruce Ytakry	En Ejecución
L.P.N. 661/11 SP2	4316/11	ROTEL Ingeniería S.R.L.	934.987.143	05/032012	150	02/08/2012	80%	Obra de Normalización de Líneas de Autoayuda en las loc. De Itaipu Pora, San Isidro, San Gabriel, Mbaracyu, Leva 4.	En ejecución
L.P.N. 661/11 SP3	4317/11	Caldetec Ing. S.R.L.	197.622.412	19/04/2012	150	16/09/2012	100%	Obra de Normalización de Líneas de Autoayuda en las loc. De Ita Vera, Boquerón, Colonia Pirapyta mi	Concluida

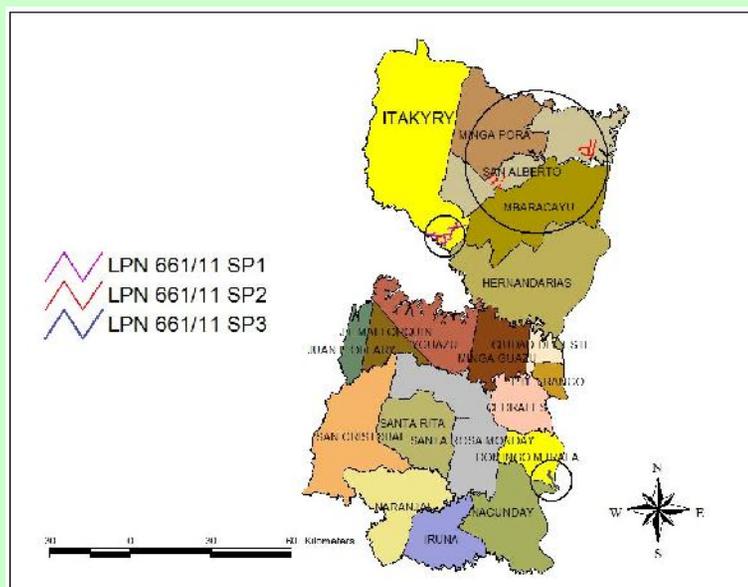


Departamento de Caaguazú

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra
LPN 662/11 SP1	4318/11	Campo Grande Ing, S.R.L.	1.960.804.970	05/03/2012	210	01/10/2012	60%	Obra de Normalización de Líneas de Autoayuda en las loc. De Correntina, Pilar, San Carlos, San Luís, Yuqueri, Zapallo, Cañadita, Candia Cue, J.S.Bogarín y Taruma	En ejecución
LPN 662/11 SP2	4318/11	Campo Grande Ing, S.R.L	1.275.706.740	05/03/2012	150	02/08/2012	10%	Obra de Normalización de Líneas de Autoayuda en las Loc. De Guayaki Kua, Yukyry Central y Baez Ñu	En ejecución
LPN 671/11 SP1	4387/11	Estesa.	938.043.925	13/08/2012	150	13/01/2013	2%	Obra de Normalización de Líneas de Autoayuda en el Distrito de Yhu (Sidepar)	En Ejecución

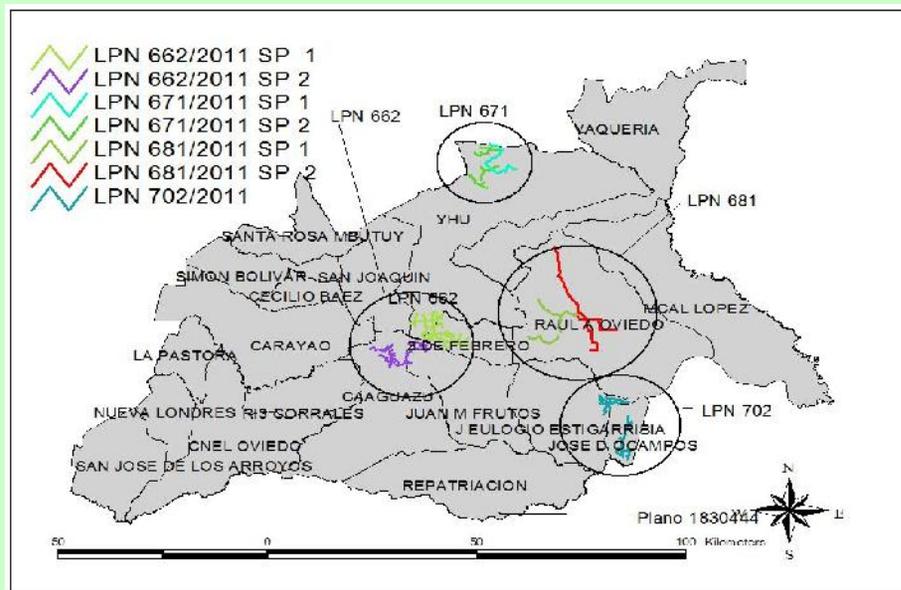


Departamento de Caaguazú

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra
LPN 671/11 SP2	4387/11	Estesa	1.010.213.770	13/08/2012	150	13/01/2013	2%	Obra de Normalización de Líneas de Autoayuda en el Distrito de Yhu (Sidepar)	En Ejecución
LPN 681/11 SP1	4405/11	Estesa	1.184.537.550	25/05/2012	180	21/11/2012	5%	Obra de Normalización de Líneas de Autoayuda en el Distrito de Raúl Arsenio Oviedo	En ejecución
LPN 681/11 SP2	4405/11	Estesa	1.732.716.475	25/05/2012	180	21/11/2012	3%	Obra de Normalización de Líneas de Autoayuda en el Distrito de Raúl Arsenio Oviedo	En ejecución

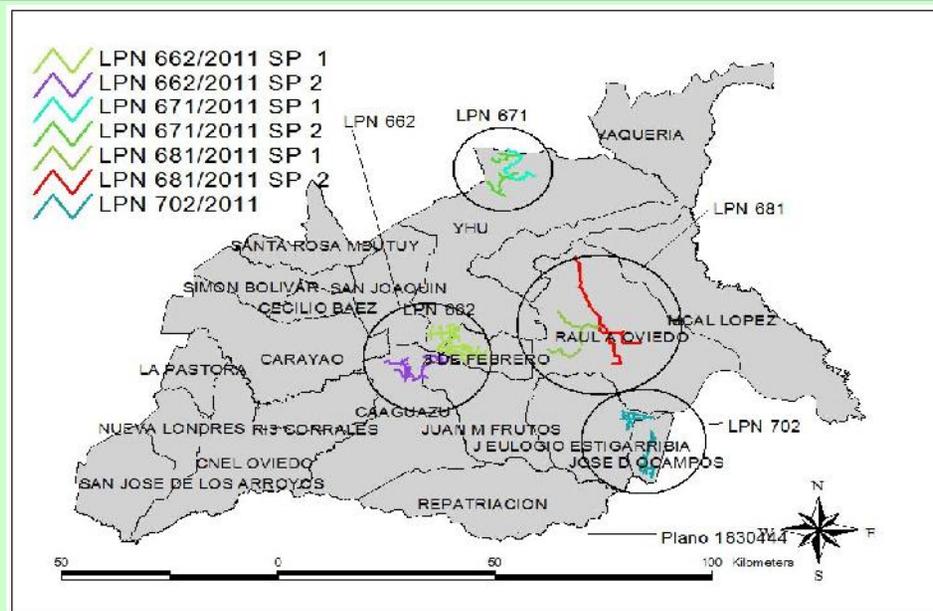


Departamento de Caaguazú

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra
702/11	4617/11	Vitex S.R.L.	1.832.771.100	13/08/2012	150	13/01/2013	3%	Obra de Normalización de Líneas de Autoayuda en los Distritos de J.E. Estigarribia y J. J. D. Ocampos	En Ejecución

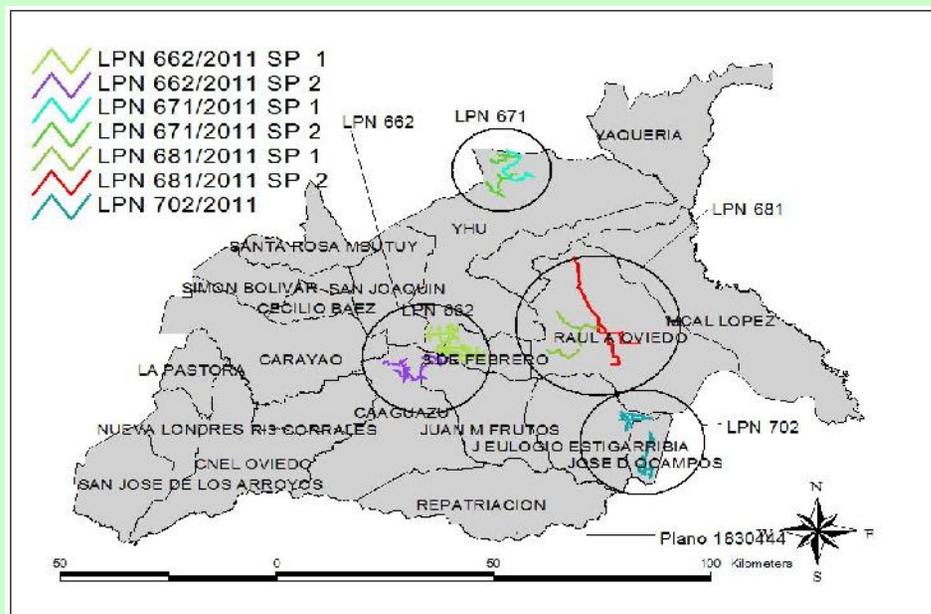


Departamento de Caazapa

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra
LPN 697/2011	4534/2011	Proel Ingeniería.	1.219.998.869	16/04/2012	150	13/09/2012	30%	Obra de Normalización de Líneas de Autoayuda en las loc. De 1 de Marzo, Tembiaporenda, Ma. De la Esperanza y Toranzo 1	En ejecución

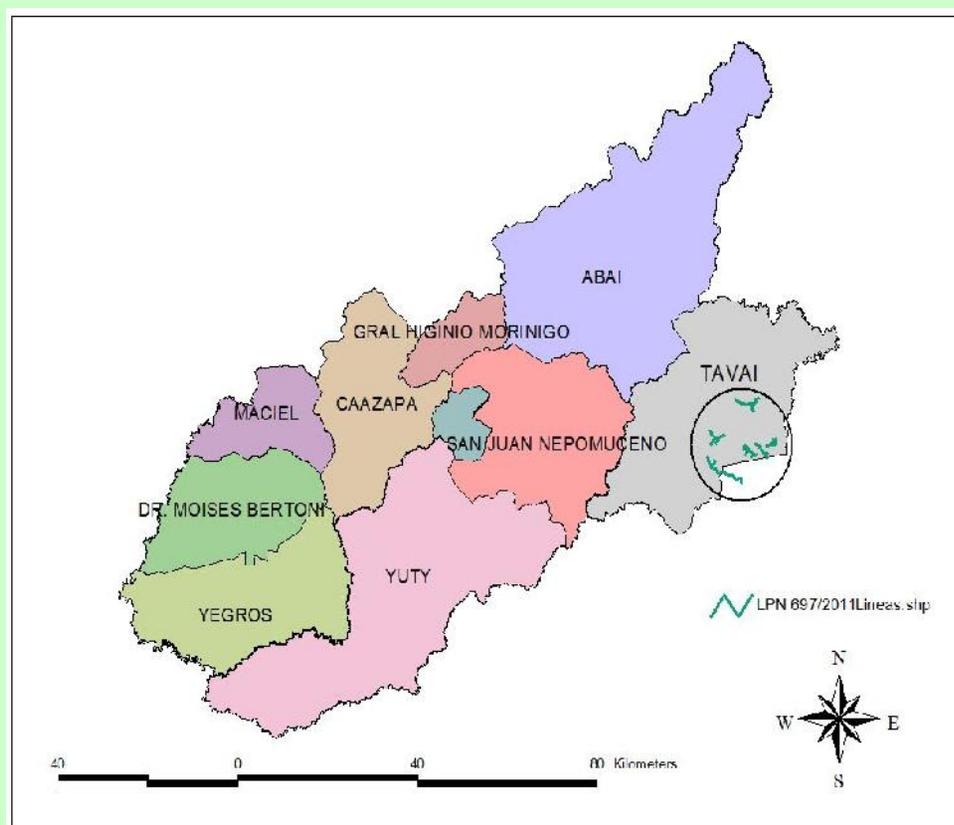


Departamento de Canindeyu

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra
LPN 699/2011	4551/2011	Rotel Ing. S.R.L.	2.491.463.000	13/06/2012	150	13/11/2012	10%	Obra de Normalización de Líneas de Autoayuda en las loc. De Sta. Rosa Mi, Araujo Cue, Sta. Catalina	En Ejecución

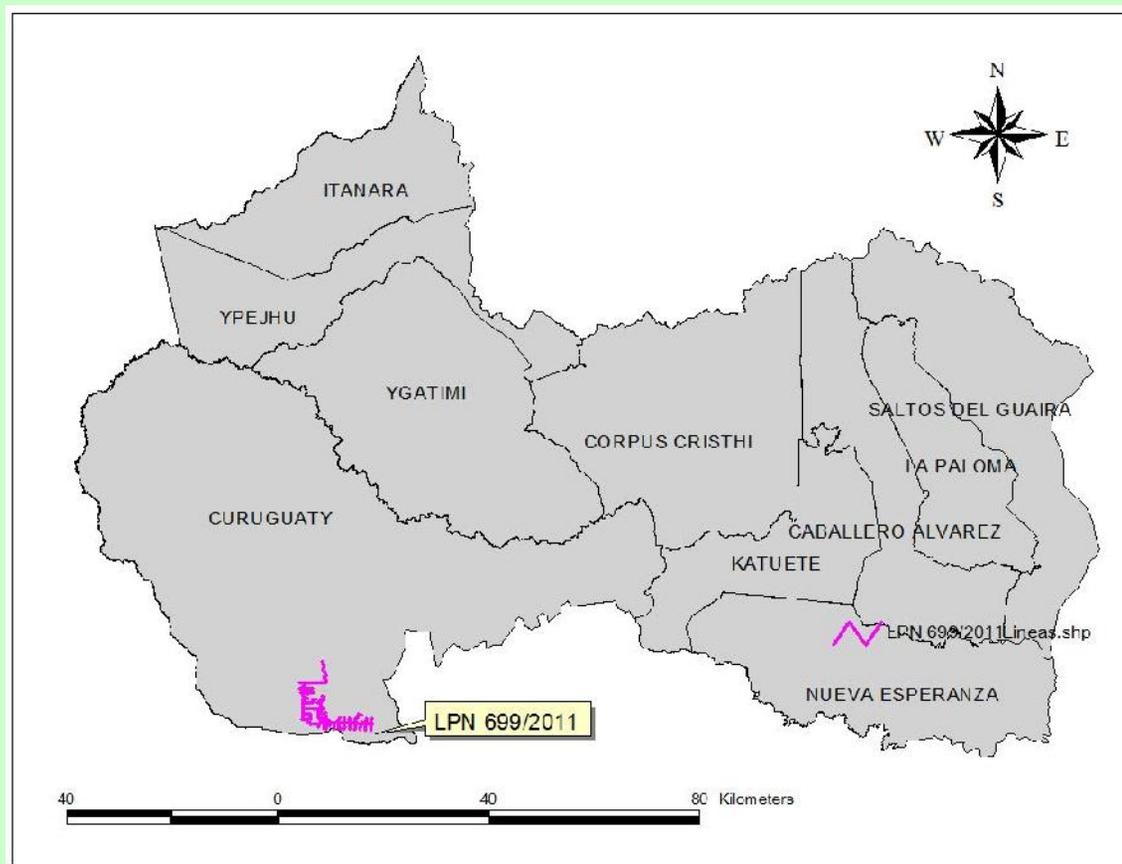


Departamento de Cordillera

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra
LPN 656/2011 S P 2	4320/11	Indel S.A.C.I.	1.079.311.344	12/02/2012	150	11/07/2012	80%	Obra de Normalización de Líneas de Autoayuda en las loc. De Loma Guazu, Costa Pucu, Ypucu, Ytu Guazu	En ejecución
L.P.N 695/2011	4550/11	Proel Ing. S.R.L.	1.672.076.874	19/04/2012	150	16/09/2012	15%	Obra de Normalización de Líneas de Autoayuda en las loc. De Sta. Teresita, Aguaity, Boquerón, Curupayty	En ejecución.

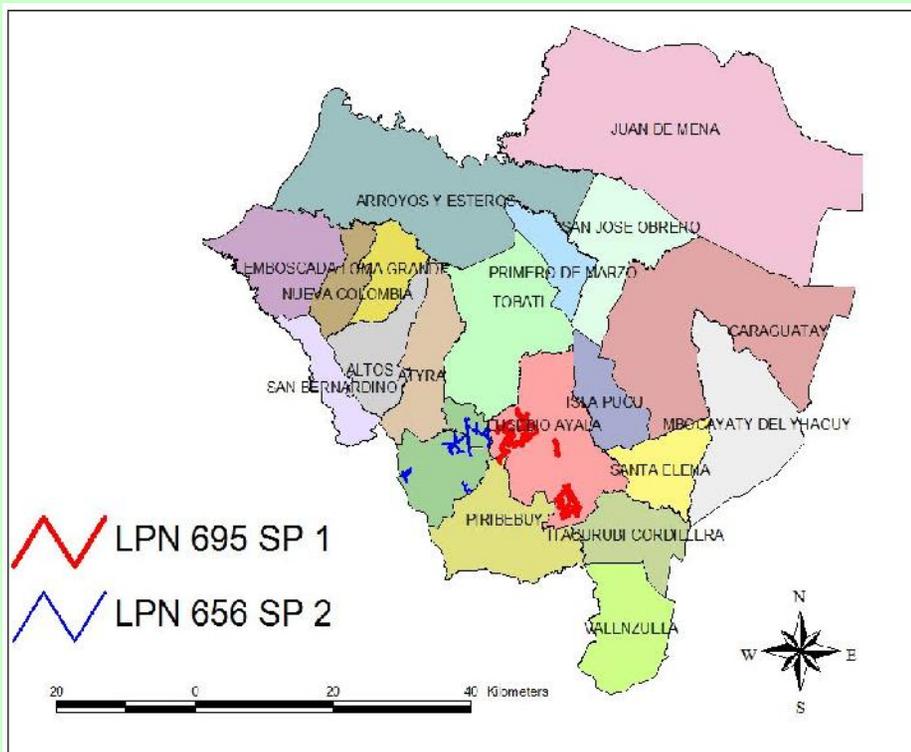


Departamento de San Pedro

Licitación	Contrato	Contratista	Monto de Contrato	Fecha de inicio	Plazo de ejecución (días)	Fecha de conclusión estimada	Avance real	Descripción de obras	Estado de la obra
LPN 656/2011 SP1	4319/2011	Don Manuel	1.377.974.512	12/02/2012	180	10/08/2012	98%	Obra de Normalización de Líneas de Autoayuda en las loc. De Luz Bella y Suizo Cue	En ejecución



OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LINEAS DE AUTOAYUDA LLAMADOS AÑO 2012 - 2013

Descripción	Localidad	Departamento	Km de línea	Costo de los Proyectos (Gs)	Situación	Financiación 2012 (Gs)	Financiación 2013 (Gs)	
LPN 781/2012	Distrito: Capiibary Loc: 1 de Noviembre, 11 de Noviembre, 25 de Diciembre	San Pedro	57	1.123.109.568	Llamado	336.932.870	786.176.698	
	Distrito: San Estanislao y Caapiibary Loc: 16 de Julio, Primavera, Cerro Verde, 3 Línea Sanguina Cué		69	1.822.551.006	Llamado	546.765.302	1.275.785.704	
INTERNO DD/OD 77/12	Distrito: Lima, Gral Resquin, Ypehu Loc: Col. Estrellita, Ana Reta 1, Quindy, La Victoria, Kiray, Vierci Cue, San Jorge, San Jorge Jejui, Mbocaya, Santa Helena		77	Gs 2.173.015.620	Llamado	651.904.686	1.521.110.934	
	Distrito: Chore Loc: Santa Rosa, Campesino I, Maria Auxiliadora Kokuera, San Antonio Kokuera, Sagrada Familia, San Rafael, 15 de Agosto		69	Gs 1.993.039.175	Llamado	597.911.753	1.395.127.423	
LPN 782/2012	Distritos: Curuguay e Ygatimi Loc Paso Real, 7 Monte, San Antonio, 11 de Setiembre, Sagrada Familia y 1 de Marzo		Canindeyu	90	2.807.654.521	Llamado	842.296.356	1.965.358.165
	Distrito Curuguay Loc: Manduará			55	1.563.484.782	Llamado	469.045.435	1.094.439.347
	Distrito Ygatimi Loc: San Blas, San Marcos, Arroyo Guazu, Ita Poty, Residentas, Jejui Mi, Primero de Marzo	88		2.679.540.711	Llamado	803.862.213	1.875.678.498	



LPN 783/2012	Distrito: Carapegua Loc: Ndavaru, Pacheco, Isla Ybate	Paraguari	87	2.712.776.163	Llamado	813.832.849	1.898.943.314
INTERNO DD/OD 78/12	Distrito: Caragegua y Roque González Loc. Potrero, Aguaí, Kaa Ybate, Calixtro, Cañete Cue, Arasaty, Rincon, Matachi, Moquete		57	Gs 1.954.578.386	Llamado	586.373.516	1.368.204.870
INTERNO DD/OD 80/12	Distrito: Yuty Loc: Typushaty, Jaguarete Cora, Kurupi, San Juan, San Juan Loma, Ayala Cue, Argaña Cue,	Caazapa	48	Gs 1.492.072.174	Llamado	447.621.652	1.044.450.522
	Distrito: Tavai Loc: Cantina Cue, Parque Nuevo Guazu, Pindo Tavai, Enramadita, Atongue		27	Gs 762.964.380	Llamado	228.889.314	534.075.066
INTERNO DD/OD 79/12	Distrito Tacuaras, Isla Umbu, Guazu Cua, General Diaz Loc: Loma Clavel, Mburica, Yataity, Costa Pindo, Karandayty, Tacuru Pyta, Loma Camba Cua	Ñeembucu	82	Gs 1.830.242.131	Llamado	549.072.639	1.281.169.492
INTERNO DD/OD 81/12	Distrito: Sta. Rosa Monday Loc: Dolores tavapy, Fátima Tavapy, San Blas, Tavapy 1	Alto Paraná	48	Gs 1.166.358.251	Llamado	349.907.475	816.450.776
	Distrito: Sta. Rosa Monday Loc: Tavapy 2 y Sta Lucía		60	Gs 1.423.111.773	Llamado	426.933.532	996.178.241

TOTAL

592

25.504.498.641

7.651.349.592

17.853.149.049

